歩道部 地先境

工事週報 実施工程表 施工報告	広島二葉の里地区西工区外整備工事他2件	工事所長	監理技術者	作成
	請負者名 株式会社 福田組 広島営業所　　作成日 2012/6/7	鈴 木	小 方	丹 野

6月

区分	工事場所	6/8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
日建リース	仮設工事 仮囲い設置	ネットフェンス設置 6号線																						
広島三協	電線共同溝（2号線）											特殊部設置×2個所 鋼矢板圧入			掘削		設置埋戻し		鋼矢板引抜き					
広島三協	電線共同溝（若草線）									蓋調整		作業帯設置												
山陽建設	若草線																				電柱撤去完了後			
山陽建設	2街区																							
山陽建設	1街区				表土スキ取り、整地、集水桝、取付管、角フリューム																			
山陽建設	2号線											交通標識基礎		照明配管		設計が決まれば			照明基礎、分電盤基礎					
山陽建設	4号線	歩道切廻し① 路盤 舗装			切替え				歩道スキ取り			歩道切廻し② 舗装	切替え									歩道切廻 北側		構造物撤去
山陽建設	4号線					箱型側溝、集水桝、歩車ブロック ①							箱型側溝、集水桝、取付管、歩車ブロック ②								歩道スキ取り			
山陽建設	4号線							地先境界 ①											地先境界 ②					
福田道路	舗装工 2号線																						仮照明配管完了後	
福田道路	舗装工 4号線																							
福田道路	舗装工 若草線																							
他企業	住宅建築（宅地②）	積水ハウス																						
他企業	電気、NTT	4号線電柱撤去																	2街区電柱撤去					
	行事			全休日							全休日			安全衛生協議会				全休日						安全教育

7月
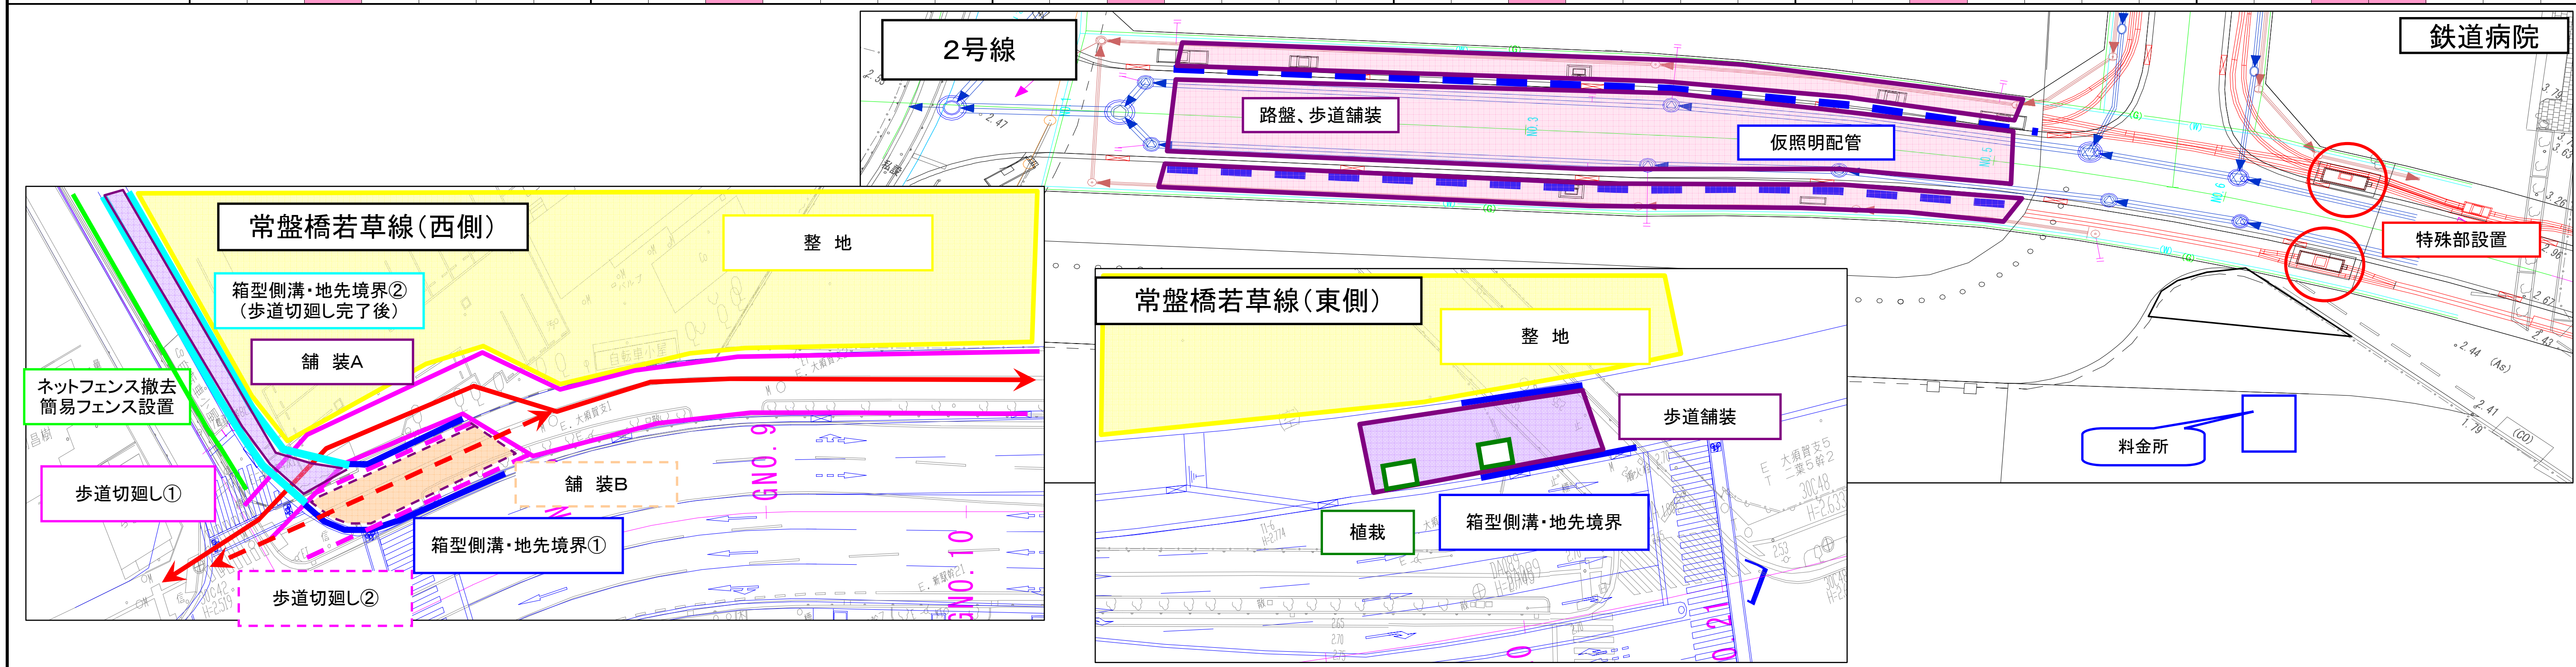
区分	工事場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
日建リース	仮設工事 仮囲い設置												ネットフェンス撤去、簡易フェンス設置 4号線							
広島三協	電線共同溝（2号線）																			
広島三協	電線共同溝（若草線）												鉄蓋調整							
山陽建設	若草線					街渠築造 地先境界	箱型側溝、集水桝、歩車ブロック				植栽×2個所	植栽ブロック、鉄蓋調整、歩道スキ取り								
山陽建設	2街区		南側整地、角フリューム設置																	
山陽建設	1街区													表土スキ取り、整地、集水桝、取付管、角フリューム						
山陽建設	2号線																			
山陽建設	4号線							歩道スキ取り		歩道切廻し① 切替え				L型撤去、車道スキ取り						
山陽建設	4号線		箱型側溝、集水桝、取付管、歩車ブロック 4号線								歩車ブロック									
山陽建設	4号線					地先境界														
福田道路	舗装工 2号線				歩道路盤			車道路盤		インターロッキング（4号線、若草線が優先）										
福田道路	舗装工 4号線		歩道路盤 A		インターロッキング A							歩道路盤 B		インターロッキング B					車道舗装	
福田道路	舗装工 若草線													歩道路盤				インターロッキング		
他企業	住宅建築（宅地②）																			
他企業	電気、NTT																			
	行事	全休日	安全大会						全休日							全休日	全休日
