工　事　週　報
実　施　工　程　表
施　工　報　告

広島二葉の里地区西工区外整備工事他2件

請負者名　株式会社 福田組　広島営業所　　作成日　2012/7/12

工事所長	監理技術者	作成
鈴 木	小 方	丹 野

工事場所　区分　月/日　曜日

7月：7/13(金) 14(土) 15(日) 16(月) 17(火) 18(水) 19(木) 20(金) 21(土) 22(日) 23(月) 24(火) 25(水) 26(木) 27(金) 28(土) 29(日) 30(月) 31(火)

8月：1(水) 2(木) 3(金) 4(土) 5(日) 6(月) 7(火) 8(水) 9(木) 10(金) 11(土) 12(日) 13(月) 14(火) 15(水) 16(木) 17(金) 18(土) 19(日) 20(月) 21(火) 22(水) 23(木)

日建リース
- 仮設工事　ネットフェンス撤去 1号線東側（25日）／ネットフェンス撤去 若草線（30日）
- 仮囲い設置

広島三協
- 電線共同溝（3号線）
  - 鋼矢板圧入 MW3-2、AW3-2（23日～25日）
  - 鋼矢板引抜き MW3-2、AW3-2（1日～2日）
  - 鉄蓋調整 若草線（17日）
  - 掘削・設置 ME3-1（25日～26日）
  - 掘削、MW3-2、AW3-2（27日～29日）
  - 設置 MW3-1（30日～31日）
  - 埋戻し（1日～2日）

山陽建設
- 3号線：測量（17日）／草刈り（18日）／試掘（18日）／鉄板搬入（19日）／仮囲い乗入（20日～22日）／歩行者通路（21日～22日）
- 若草線：歩道スキ取（14日～15日）／植栽×2個所（17日～18日）／水道管試掘（23日～）
- 2街区：箱型側溝、集水桝（14日～15日）／歩車ブロック（18日～19日）／乗入築造 東側（18日～19日）／沈砂桝移設、取付管直し（20日～23日）／乗入築造、西側（24日～25日）／立入防止柵（26日～29日）
- 1街区：表土スキ取り、整地、集水桝、取付管、角フリューム（14日～22日）／沈砂桝設置、法面整形 北側（23日～26日）／取付管設置 南側（26日～29日）／不陸整正（30日～2日）
- 2号線：**照明の設計、横断歩道の位置決定次第計画立案**（17日～27日）
- 4号線：歩道スキ取り 北側（14日～15日）／L型街渠 北側（14日～15日）／L型街渠 型枠解体、車道復旧（18日～19日）／歩道切廻し、歩車ブロック ①（21日～22日）／**関係諸官庁協議、設計決定次第計画立案**（17日～27日）
- 交差点改良

福田道路
- 舗装工 2号線：車道路盤（24日～26日）／**照明工事完了次第舗装実施**（29日～30日）
- 舗装工 4号線：路盤 A（19日）／舗装 As舗装（20日～21日）／インターロッキング A（20日～22日）／路盤 B（23日）／インターロッキング B（24日～26日）／歩道路盤（21日～22日）／インターロッキング（26日～29日）／乗入舗装（26日～27日）／**交差点改良後車道舗装実施**（13日～）
- 若草線
- 2街区

他企業
- 住宅建築（宅地②）：積水ハウス、大和ハウス（14日～）
- 中国電力：2街区北側建柱？（23日～25日）
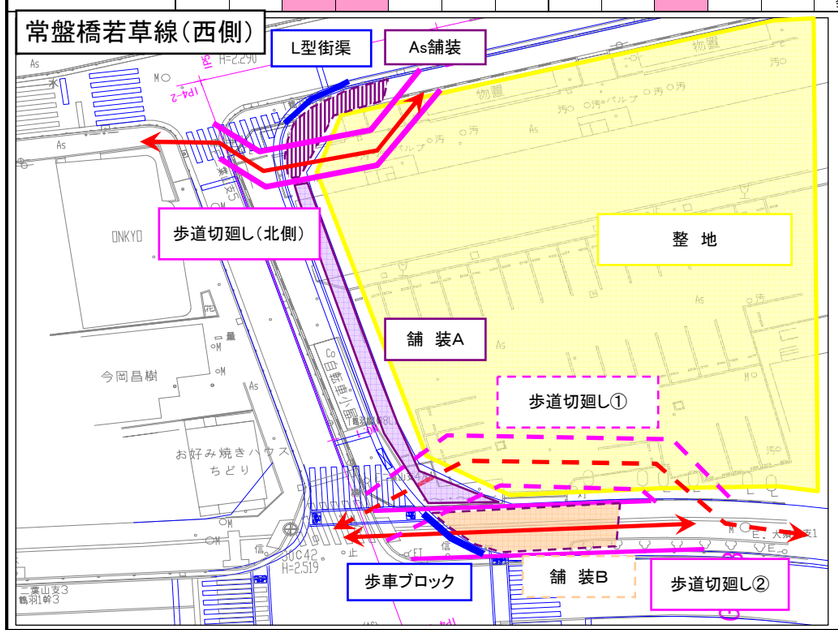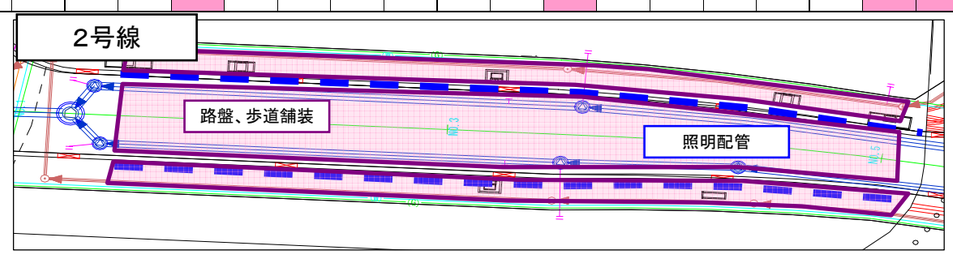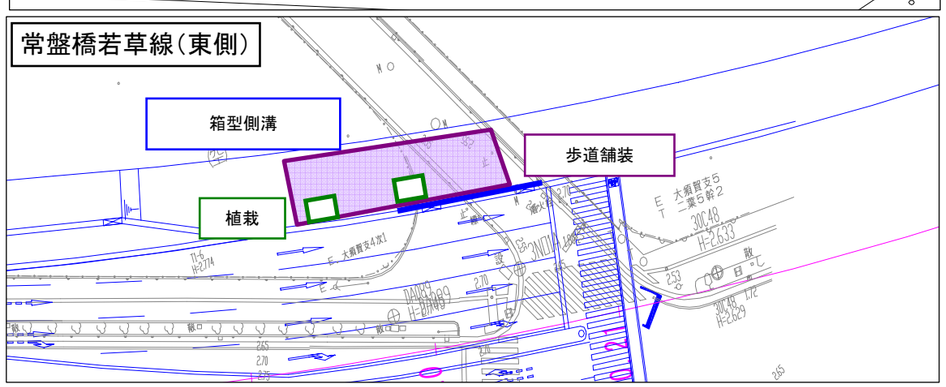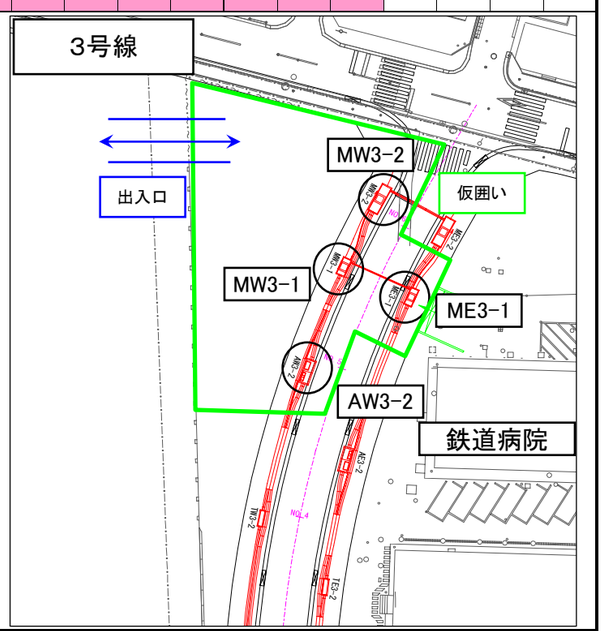
行事
- 全休日：15日、16日、22日、29日、5日、11日、12日、13日、14日、15日、16日、17日、18日、19日
- 安全衛生協議会：25日
- 安全教育：28日
- 安全大会：1日
