工事週報
実施工程表
施工報告

広島二葉の里地区西工区外整備工事他2件

請負者名 株式会社 福田組 広島営業所　　作成日 2012/12/27

工事所長	監理技術者	作成
鈴木	小方	丹野

1月 / 2月
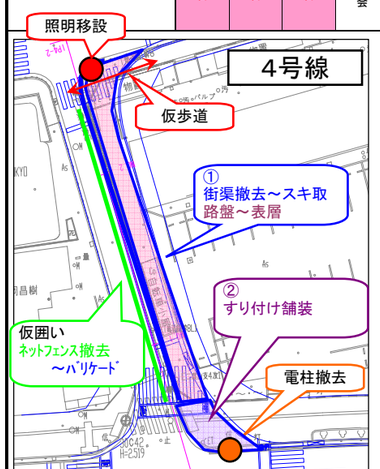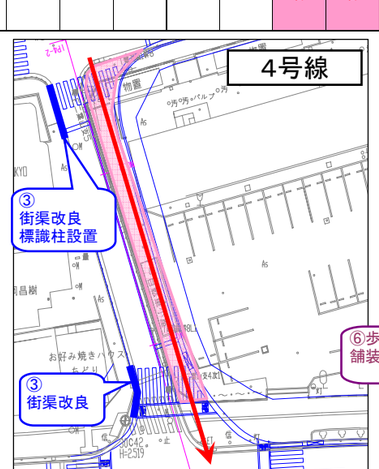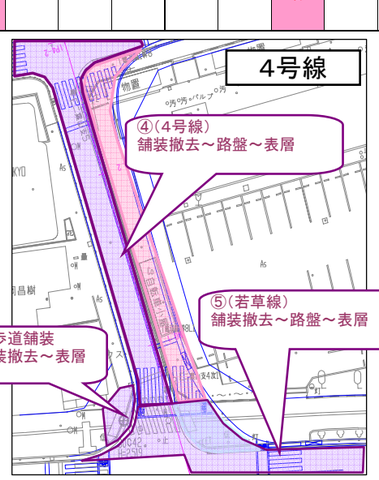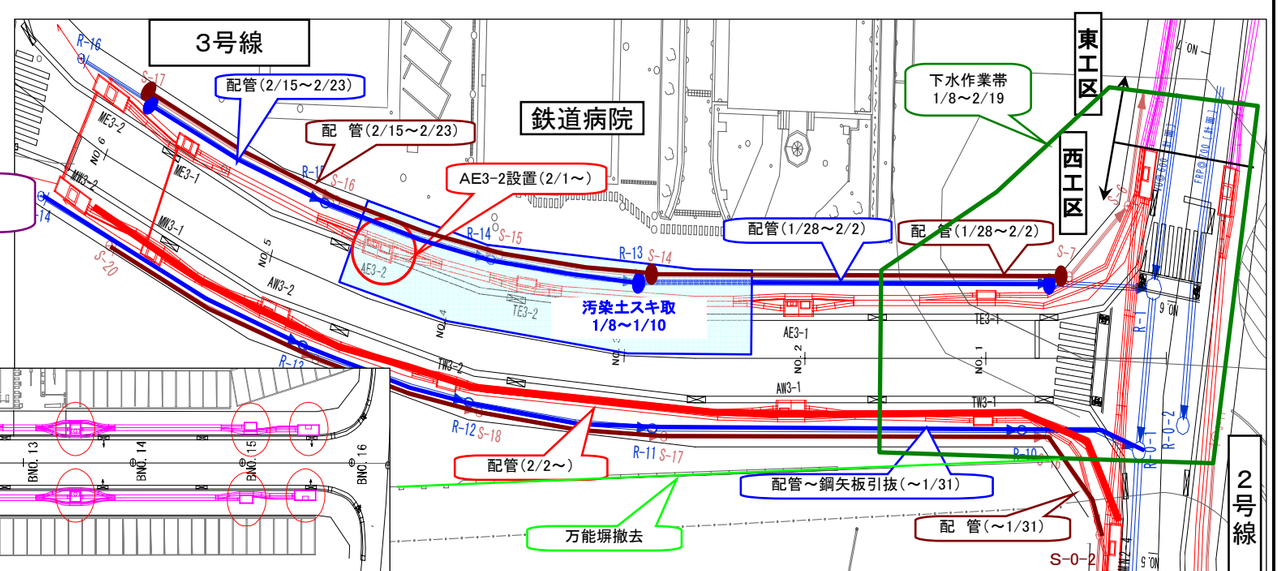
工事場所	区分	1月	2月
日建リース	仮設工事		4号線フェンス撤去
	仮囲い設置		3街区万能塀撤去 歩道閉鎖
山陽建設	3号線	汚染土スキ取搬出	
	3街区	草刈り、搬出、表土スキ取り 表土搬出 鉄板搬出（半分） 整地工 沈砂桝、取付管 西側より 角フリューム 角フリューム 表土スキ取搬出 整地工 3街区東側	
	1街区	検査段取り その2工事竣工検査 2号線、4号線、若草線	
	4号線	関係諸官庁協議、設計決定次第計画立案 照明移設 4号線北側 バリケード設置 ③ 街渠改良	
	交差点改良	①街渠撤去～スキ取 仮歩道	
	電線共同溝	鋼矢板圧入 AE3-2 掘削 AE3-2 設置 鋼矢板引抜き AE3-2	
	3号線	布掘り AE3-2 配管 北西側より 配管 北西側より ～2/16	
福田道路	舗装工 4号線	インターロッキング 検査段取り ① 路盤～表層 ②すり付け舗装 ④ 路盤～表層	
テリトリー開発	電線共同溝（2号線）（東工区 その1）	圧入 MN2-7、MS2-4 病院歩道切替え 掘削 布掘り MN2-7、MS2-4、MN2-6 設置 引抜き MN2-7、MS2-4 不陸整正、片付け	
	高速公社	機械組立 地盤改良	
	1号公園（広成建設）	植樹	
他企業	中国電力	他企業ケーブル撤去～抜柱 1街区北側 電柱撤去（4号線南側）	
	下水道工事 河井建設工業	鋼矢板圧入 2号線北側（東工区） 薬注 薬注 2号線北側（東工区） ロータリー切替え～鋼矢板圧入 配管～鋼矢板引抜き ～2/19	
		配管（3号線東側） 雨水、汚水配管 3号線東側 鋼矢板引抜き	
行事		全休日、全休日、全休日、安全大会、全休日、全休日、全休日、安全衛生協議会、安全教育、全休日、安全大会、全休日、全休日、全休日
