工事週報
実施工程表
施工報告

広島二葉の里地区東工区外整備工事他1件

請負者名 株式会社 福田組 広島営業所　　作成日 2014/1/6

工事所長	作成
鈴木	丹野

1月 / 2月

工事場所	区分	月/日	曜日
日建リース	仮設工事		
山陽建設	5号線		
山陽建設	6号線		
山陽建設	駅前		
山陽建設	5街区		
福田道路	舗装工	車道舗装	
福田道路	舗装工	歩道舗装	
テリトリー開発	電線共同溝、照明基礎		
三喜産業	照明施設		
中電工	信号機		
他企業	高速公社		
他企業	緑地工事	増岡組	
他企業	病院工事	広成建設	
他企業	5号線工事	河崎組	
他企業	駅前下水(推進)	山陽工業	
他企業	電力、NTT ガス、水道		
行事			
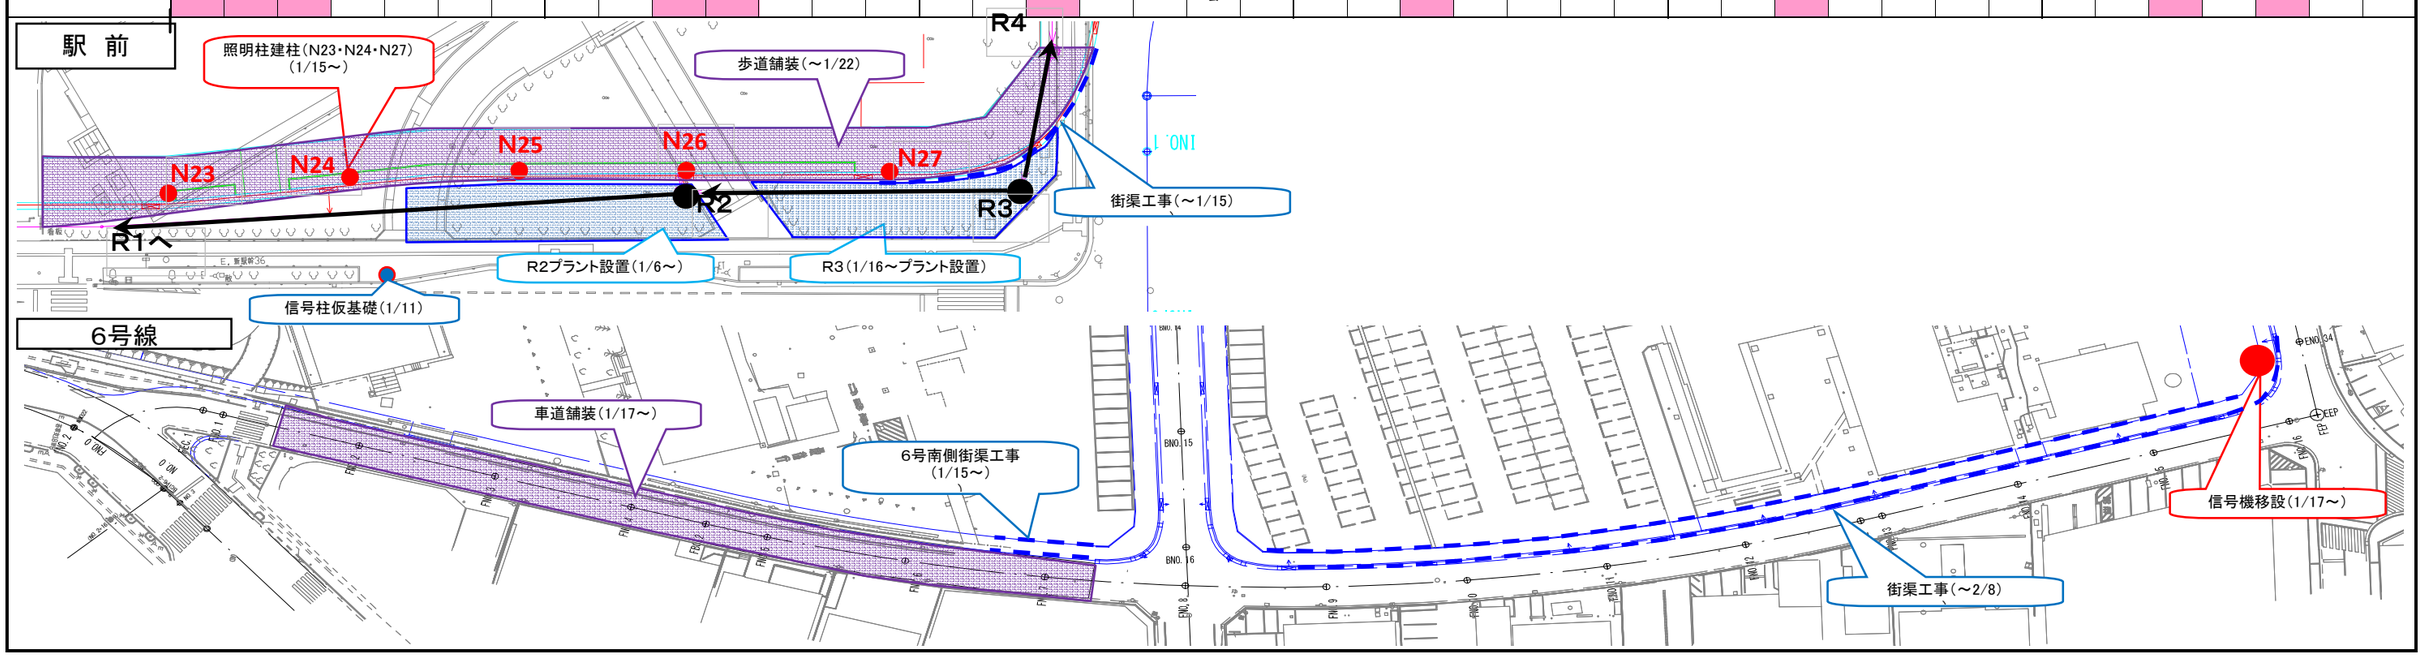
月/日	曜日	工事場所 / 区分	内容
1/3	金	行事	全休日
4	土	行事	全休日
5	日	行事	全休日
6	月	山陽建設 6号線	既設L型撤去、箱型側溝設置、歩車ブロック、取付管閉塞 6号線南側
6	月	山陽建設 6号線	6×5号交差点 信号基礎設置
6	月	行事	安全大会
7	火	山陽建設 6号線	既設L型撤去、箱型側溝設置、歩車ブロック、取付管閉塞 6号線南側
8	水	山陽建設 6号線	既設L型撤去、箱型側溝設置、歩車ブロック、取付管閉塞 6号線南側
9	木	山陽建設 6号線	既設L型撤去、箱型側溝設置、歩車ブロック、取付管閉塞 6号線南側
10	金	山陽建設 駅前	箱型側溝、集水桝、歩車ブロック、スキ取り 場外
11	土	山陽建設 6号線	既設L型撤去、箱型側溝設置、歩車ブロック、取付管閉塞 6号線南側
12	日	行事	全休日
13	月	行事	全休日
14	火	山陽建設 6号線	取付管撤去 6号南側
15	水	山陽建設 6号線	箱型側溝 6号線南側
16	木	山陽建設 6号線	箱型側溝 6号線南側
17	金	山陽建設 5街区	歩道切替
17	金	福田道路 舗装工 車道舗装	車道舗装 6号線南側(750㎡)
18	土	山陽建設 6号線	箱型側溝 6号線北側
19	日	行事	全休日
20	月	福田道路 舗装工 歩道舗装	歩道路盤整正(一部舗装撤去) 駅前(交差点付近)
21	火	福田道路 舗装工 歩道舗装	インターロッキング設置 駅前(210㎡)
22	水	他企業 病院工事	安全協議会
23	木	福田道路 舗装工 歩道舗装	インターロッキング設置 駅前(210㎡)
24	金	テリトリー開発 電線共同溝、照明基礎	鉄蓋仕上げ
25	土	三喜産業 照明施設	照明設置 N23・N24・N27 配線
26	日	行事	全休日
27	月	山陽建設 6号線	歩道切替
28	火	山陽建設 6号線	既設擁壁撤去、歩車道ブロック、地先境界、スキ取
29	水	山陽建設 6号線	既設擁壁撤去、歩車道ブロック、地先境界、スキ取
30	木	山陽建設 6号線	既設擁壁撤去、歩車道ブロック、地先境界、スキ取
31	金	中電工 信号機	信号切替 6×5号交差点
31	金	山陽建設 駅前	切替段取
1	土	他企業 高速公社	街渠築造～歩道舗装 若草線南
2	日	行事	全休日
2	日	山陽建設 駅前	歩道切替 若草線北側
3	月	他企業 5号線工事	仮囲い 5街区
3	月	他企業 高速公社	街渠築造～歩道舗装 若草線南
3	月	他企業 駅前下水(推進)	プラント設置～推進～プラント撤去 R1～R01
3	月	他企業 駅前下水(推進)	プラント設置～推進～プラント撤去 R2～R1
3	月	山陽建設 駅前	既設構造物撤去、スキ取り
3	月	山陽建設 5街区	既設構造物撤去～切盛～二次防災
3	月	福田道路 舗装工 車道舗装	車道舗装A、仮舗装 (1400㎡)
4	火	他企業 高速公社	街渠築造～歩道舗装 若草線南
4	火	他企業 駅前下水(推進)	人孔設置 R1
5	水	他企業 高速公社	街渠築造～歩道舗装 若草線南
6	木	他企業 高速公社	街渠築造～歩道舗装 若草線南
7	金	他企業 駅前下水(推進)	人孔設置 R1
8	土	他企業 駅前下水(推進)	人孔設置 R1
9	日	行事	全休日
10	月	他企業 駅前下水(推進)	人孔設置 R2
11	火	行事	全休日
12	水	山陽建設 6号線	既設構造物撤去 ローソン前
12	水	他企業 高速公社	車道舗装 若草線北側
13	木	他企業 駅前下水(推進)	人孔設置 R3
